

Relazione

mensile
novembre 2024

Report
di monitoraggio
del PNRR Mimit



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Stato di avanzamento


In sintesi

I Target e Milestone complessivi del MIMIT sono 44.

Ad oggi, sono state completate con successo – incluse le verifiche della Commissione – tutti i 15 obiettivi (12 Milestone e 3 Target) degli anni 2021-2022-2023 e T2 2024, che si componevano di: 3 Milestone nel 2021; 5 Milestone nel 2022; 3 Milestone e 2 Target nel 2023. Nell'anno in corso 2024, sono state completate 1 Milestone e 1 Target del primo semestre. Restano da completare 11 Milestone e 18 Target, di cui 8 Milestone afferenti all'anno in corso 2024.

La spesa dichiarata fino al 31 ottobre 2024 ammonta a 14,18 miliardi di euro, il 49,16% della quota RRF per il MIMIT. Entro la fine dell'anno 2024 si stima una spesa dichiarata che salirà a 18 miliardi di euro. Infine, negli anni seguenti, in linea con l'accelerazione del processo di attuazione e rendicontazione delle spese previsto, dovrebbero essere spesi i 14,66 miliardi restanti.

**Ad oggi, sono stati
completati con successo
tutti i Milestone e Target di
competenza del MIMIT.**

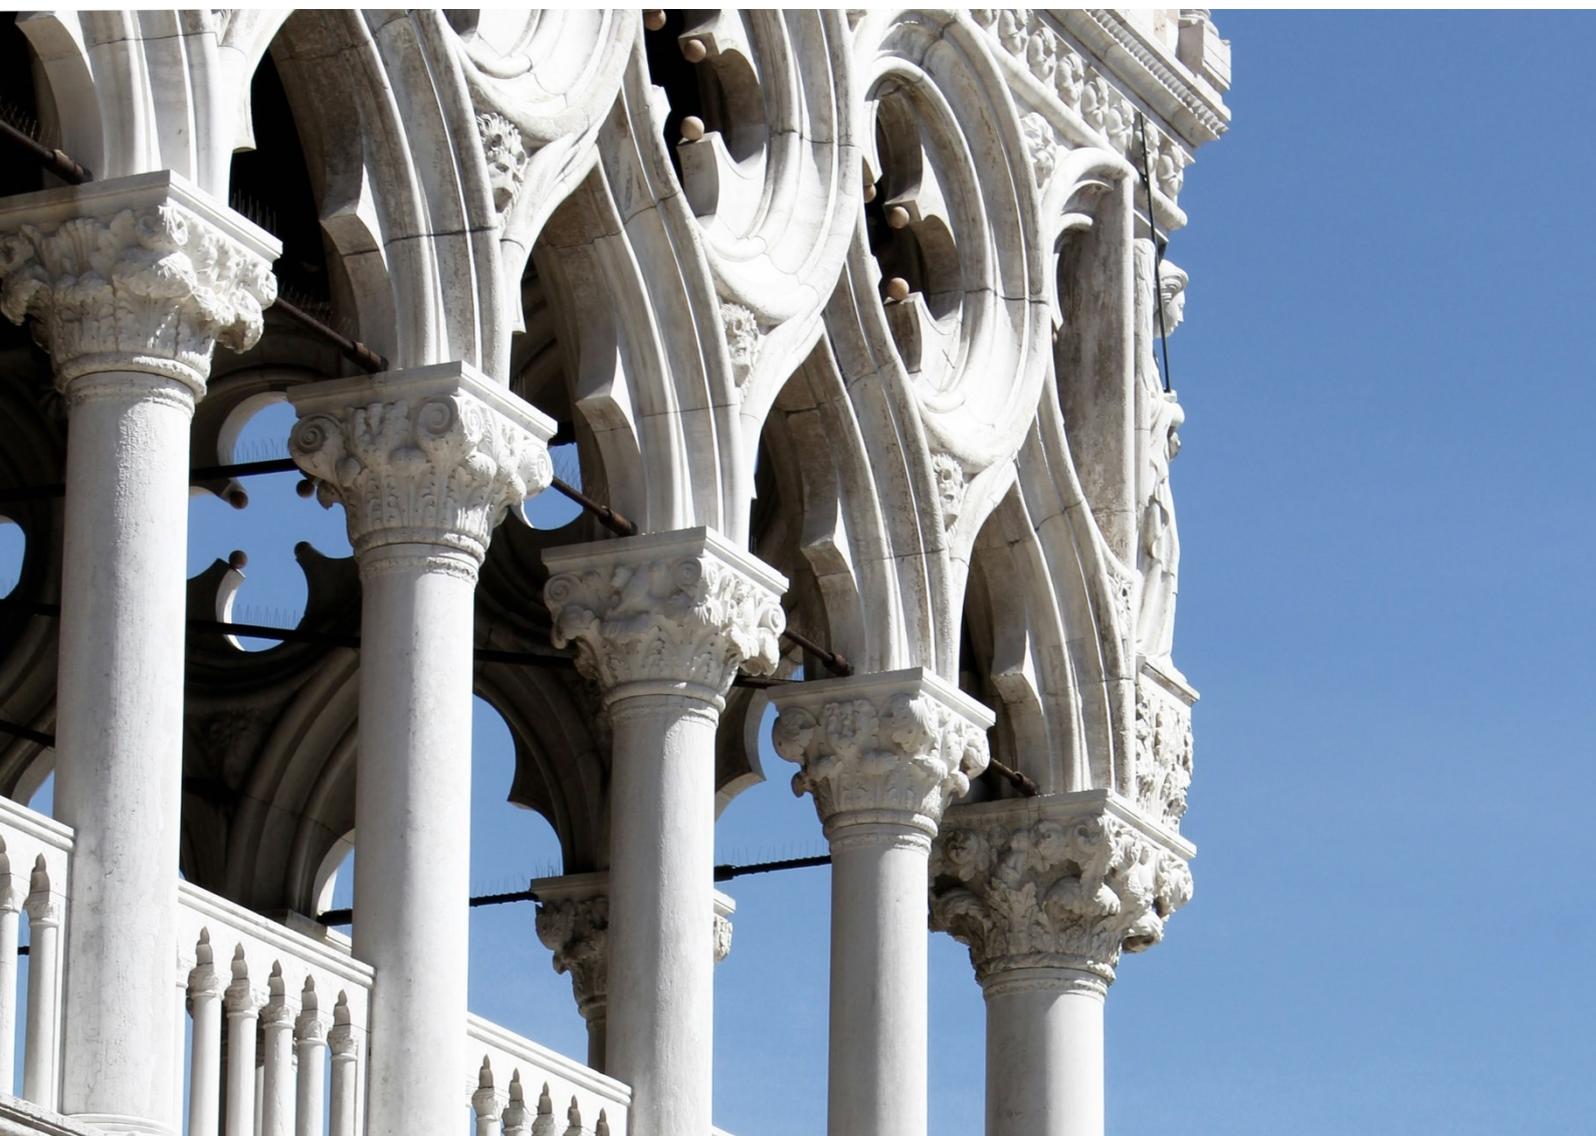

Avanzamento Milestone & Target

In base all'allegato alla Decisione di approvazione del Consiglio UE del 13 luglio 2021, rivisto a seguito della revisione PNRR, il MIMIT è tenuto al raggiungimento di un totale di 44 traguardi e obiettivi (di cui 23 Milestone e 21 Target) sino al 2026.

Ad oggi sono state conseguite tutte le 15 Milestone e i Target previsti fino al T3 2024, con un tasso di completamento pari al 34% (Figura 1). Considerando, invece, i soli M&T previsti fino al T3 2024, il tasso di completamento risulta pari al 100% alla data odierna.

I prossimi due anni e mezzo di attuazione delle misure PNRR (T4 2024; 2025; 2026) saranno particolarmente intensi, alla luce non solo del numero di obiettivi da perseguire (29 entro il T2 2026).

Tra i 44 obiettivi complessivi, oltre il 40% sono concentrati nella Missione 1 dedicata alla digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo (8 Milestone e 8 Target totali): al T3 2024, 6 (4 Milestone e 2 Target) di questi sono stati conseguiti in linea con il cronoprogramma fisico previsto.

Figura 1: Tasso di completamento Milestone e Target

Note: Aggiornato al
31/10/2024


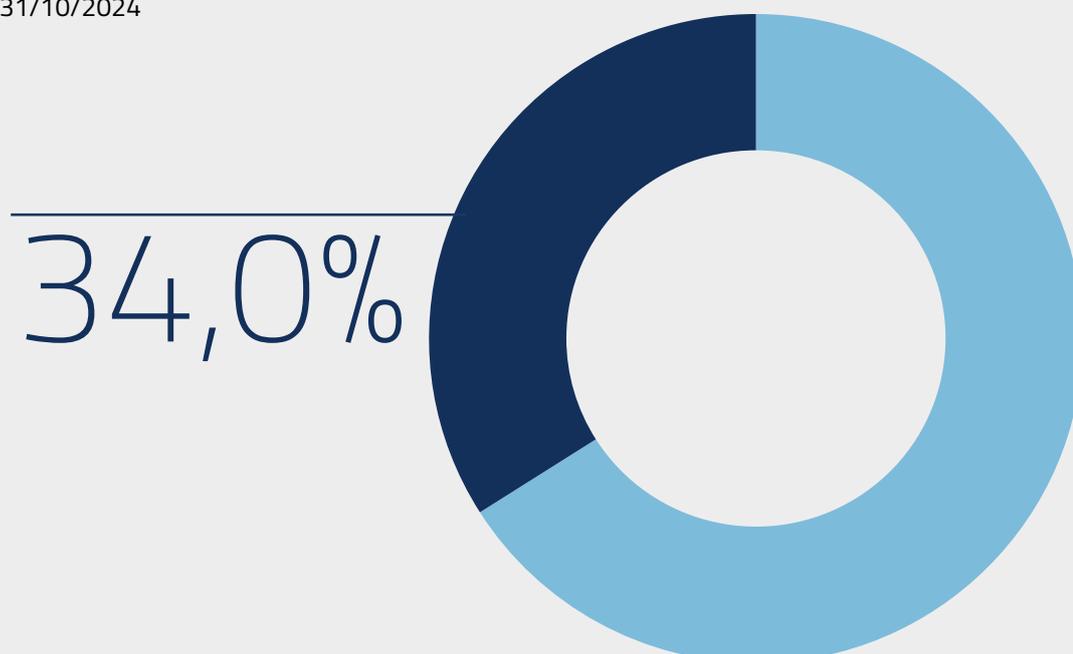


Figura 2: Milestone e Target MIMIT conseguiti e da conseguire entro il T2 2026

Note: Aggiornato al 31/10/2024

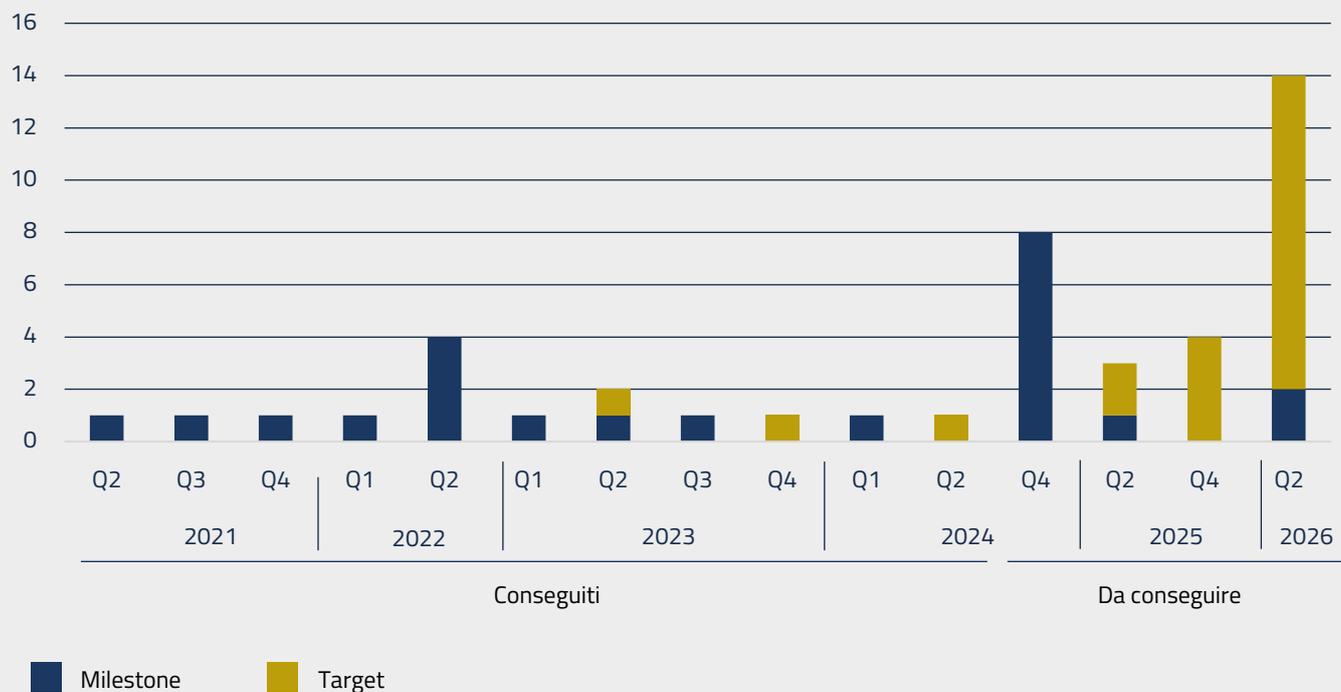

La componente preponderante di risultato è in capo alla Direzione Generale di Incentivi alle Imprese (DGIAl), la quale ha portato a compimento 8 Milestone e 2 Target, con altre 8 Milestone e 8 Target da raggiungere entro il T2 2026.

Per ciò che concerne la Direzione Generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy (DG IND), la seconda Direzione per numero di traguardi e obiettivi assegnati, sono state ad oggi conseguite 3 Milestone e 1 Target, con un residuo di una Milestone e 9 Target.


La Direzione Generale per la Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGPI-UIBM) ha invece conseguito una sola Milestone, con un Target da raggiungere entro il T4 2025.

Le ultime due Milestone sono invece rispettivamente sotto la competenza dell'Ufficio Legislativo/DG IAI da raggiungere entro il T2 2025 e il T2 2026.

Nella figura a seguire, sono individuate le Direzioni Generali responsabili del raggiungimento di Milestone e Target per le misure di competenza del MIMIT.

Figura 4: Milestone e Target MIMIT conseguiti e da conseguire entro il T2 2026 per Direzione competente

Note: Aggiornato al 31/10/2024

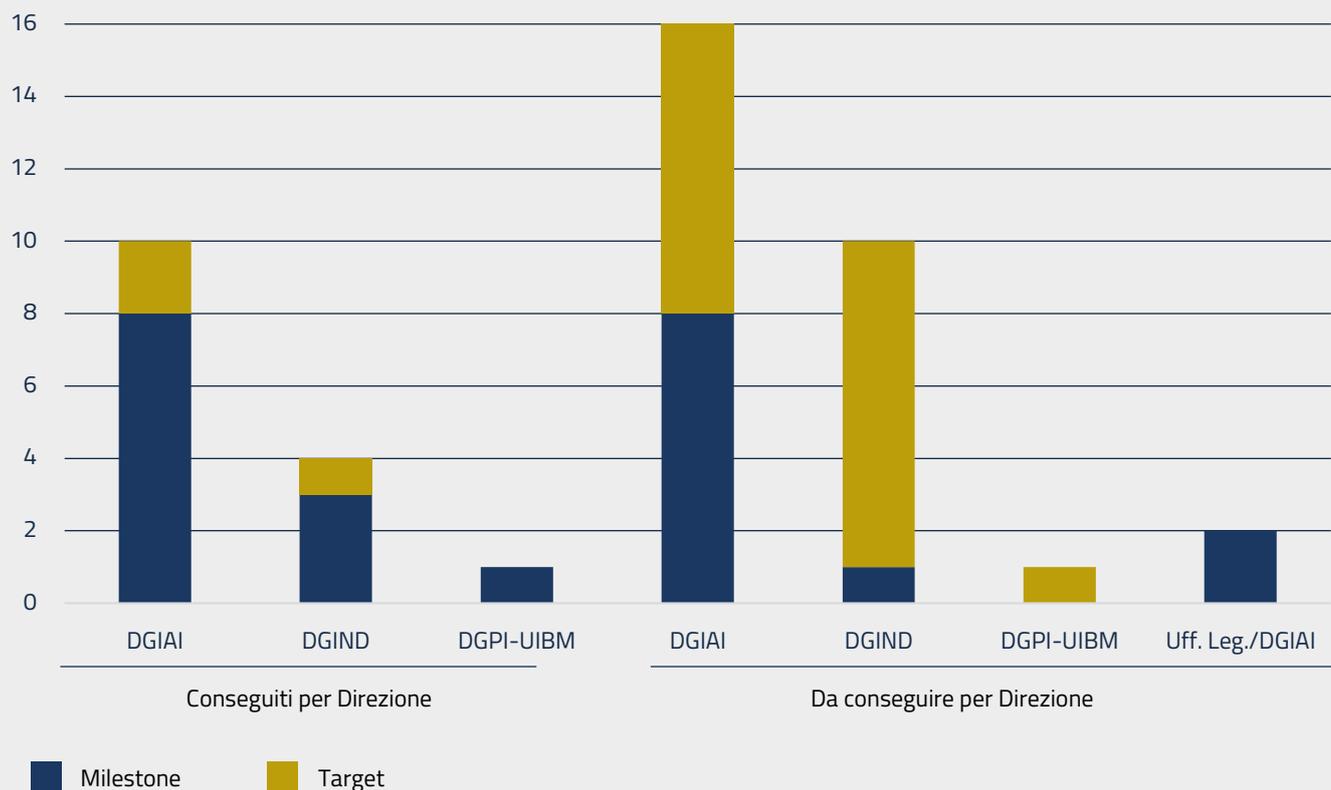

La tabella sottostante riepiloga la distribuzione dei 44 Milestone e Target tra le 16 misure di competenza del MIMIT (2 Riforme e 14 Investimenti), evidenziando lo stato di avanzamento per anno e trimestre.

Tabella 1 - Sintesi M&T del MIMIT per anno (aggiornato al 31/10/2024)

		Sintesi M&T del MIMIT per anno																				
		2021			2022				2023				2024				2025				2026	
		T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
M1C2	1.1 TRANSIZIONE 4.0			M										T				T				
	4.1 TECNOLOGIE SPAZIALI								M													TT
	5.2 FILIERE				M							T										
	6.1 INV. PROP. IND.																			T		
	7 NET ZERO															M		M				T
	R3 RIFORMA INCENTIVI																	M				M
	R1 RIFORMA CODICE P.I.										M											
M2C2	5.1 RINN. - BATTERIE					M										M		M		T		
	5.4 START-UP GREEN					M										M						T
M4C2	2.1 IPCEI	M				M				M									T			
	2.2 BIS ACCORDI DI INNOVAZIONE																			T		
	2.3 CENTRI TRASF. TEC.																			T		TT
	3.2 START-UP					M										M						T
M5C1	1.2 IMP. FEMMINILE	M								T											T	
M7	15 TRANSIZIONE 5.0													M								TT
	16 SUPPORTO PMI - FER															M		M				T

M - Milestone

T - Target

 Target / Milestone completati

Avanzamento della spesa

Ai sensi della Circolare MEF-RGS n. 27 del 21/06/2022, si definisce spesa dichiarata una spesa di tipo finanziario, cioè che risulta effettiva nel momento in cui si registra un'uscita di cassa nei confronti del creditore, attraverso apposito mandato di pagamento. In questa sezione si presenta il dato cumulato delle spese dichiarate dai Soggetti Attuatori a carico del PNRR, a prescindere dal fatto che tali spese siano state oggetto di rendicontazione o meno.

In termini di avanzamento di spesa per l'attuazione dei progetti, il MIMIT ha registrato, al 31 ottobre 2024, una spesa pari al 49,16% (Figura in basso) del totale delle risorse PNRR assegnate (28.842 miliardi).

Figura 8: Percentuale di spesa dichiarata rispetto al totale delle risorse PNRR MIMIT

Note: Fonte ReGiS – Dato su
spesa dichiarata al 31/10/2024

